Apple OLS取次

【Apple OLS】FY24商戦期の受付強化

【2024040500003】

モバイル事業推進本部

2024/04/15

For Your Eyes Only B | ©2024 SoftBank Corp.

AppleOLS取次ぎ おさらい

※NDA名称：Himalaya

購入フロー

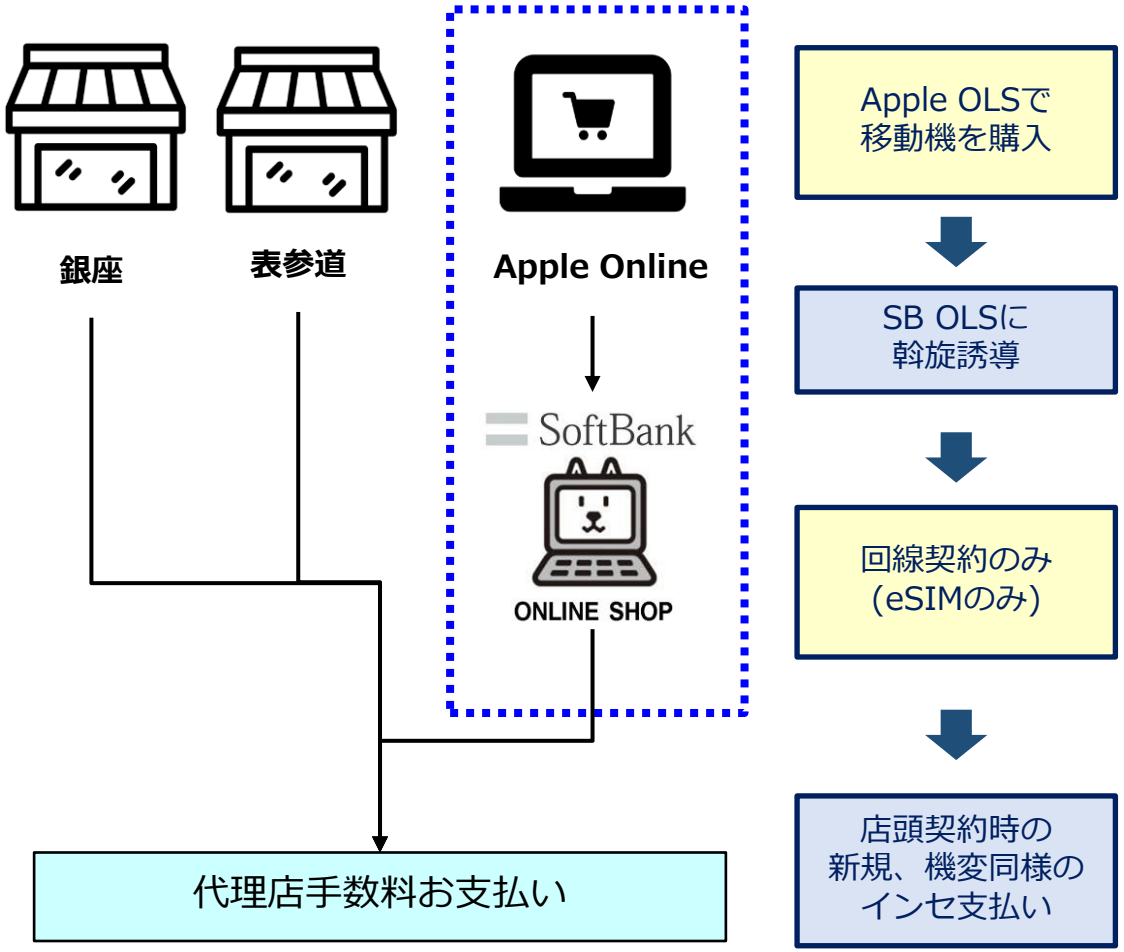

実績 ※2024/3/26時点

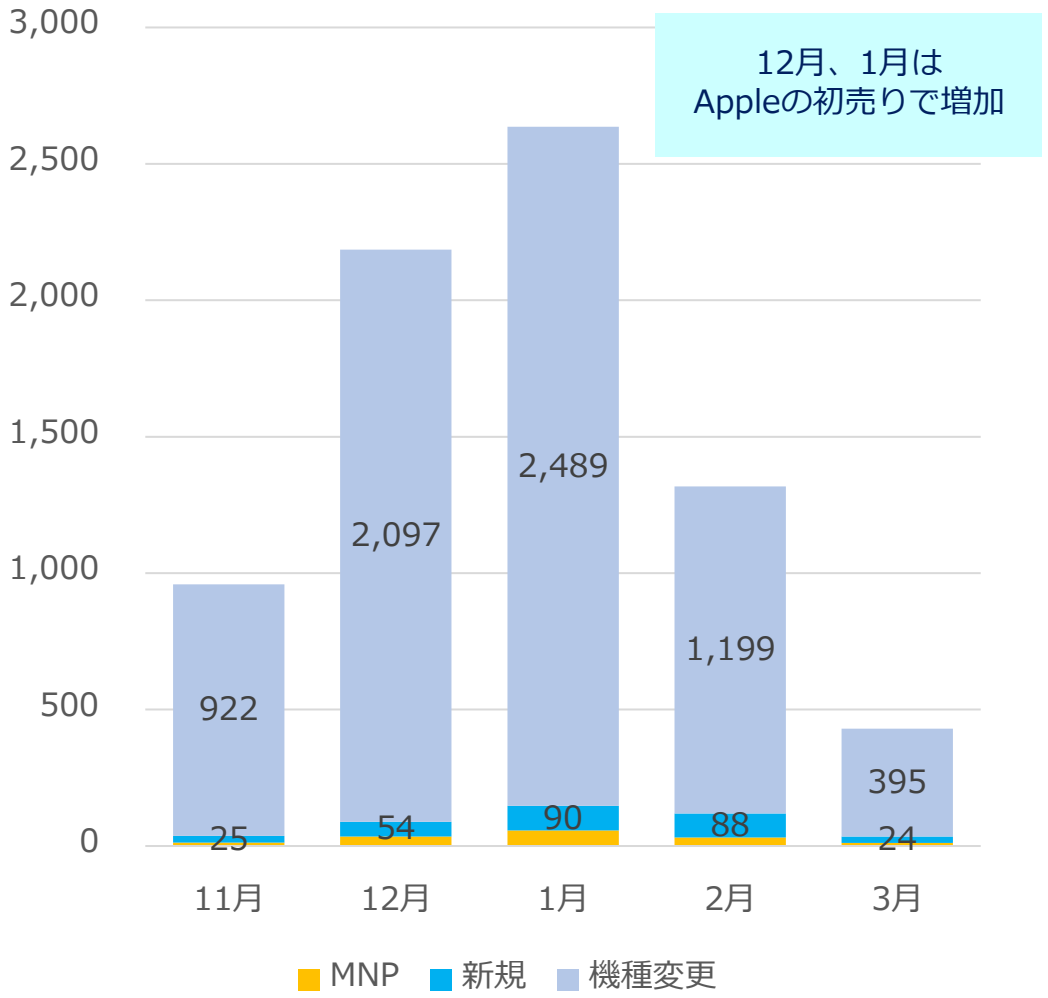

背景相談内容サマリ

背景	Appleより、24年度新商品発売時期の流入予測件数および、システム設計要求件数の連携あり。 ✓　流入予測件数 → SB側としても問題なく受付可能な数量 ✓　システム設計要求数　→ 流入予測件数の5倍の体制が必要（現状のキャパでは対応不可）
対応内容	Appleのシステム設計要求数で準備が2024年9月までに可能か、体制の構築および検討

施策概要

概要	2024年9月の新商品発売時期に向け、 Appleから連携されてきたシステム設計要求数で受付可能か フロントおよびバックオフィスのシステム負荷の確認および体制増強		
契約タイプ	個人契約のみ		
受付チャネル	SB OLSのみ		
受付業務	新規（MNP、番号移行含む）、機種変更　※eSIM単体契約のみ受付（移動機＋SIMセットはなし）		
提供サービス	SIM単体契約で可能なサービスおよびオプション　※あんしん保証サービスなど移動機に紐づくサービスは非提供		
Apple要求内容	OLS流入件数	4,400件/h	初動1時間（21:00～22:00、22：00以降は1,000件未満）
	システム要求件数	22,000件/h	OLS流入件数の5倍
	1秒当たりのトランザクション処理件数	最大100	ベースは30、最大100に耐えれるようにしてほしいとの要望
依頼内容	✓ フロントおよびバックオフィスの影響システムの確認 ✓ 影響システムの負荷およびキャパの確認 ✓ 影響システムの増強		
実装時期	2024年8月		
備考	Apple要求内容詳細はP7参照		

対象システム

		GINIE	FAX	G3 BFS	SB-OLS	YM-OLS／LM-OLS／法人ーOLS			かんたん手続き	料金シミュレータ	MySB	MySBアプリ	IVR	CORELIS care	コールGINIE	法人コンシェル	GINIE-POS	備考
						OLフロント	NFA	OLS-Care										
S-in日					2024年8月													
純新規					●													eSIM単体契約のみ
MNP転入					●													eSIM単体契約のみ
機種変更/契約変更					●													eSIM単体契約のみ
番号移行					●													eSIM単体契約のみ
移動機物品販売																		
特典利用/保証適用(移動機物販)																		
情報変更																		
解約（転出含む）																		
MNP予約番号発行																		
故障修理																		
SIM交換/再発行																		
譲渡																		
承継																		
電話番号変更																		
請求先変更																		
情報照会	契約情報																	
	料金請求情報																	
下取り																		
でんき																		

Apple OLS取次ぎ システム鳥瞰図

※以下以外にも影響のある関連システムの有無含め確認をお願いいたします。

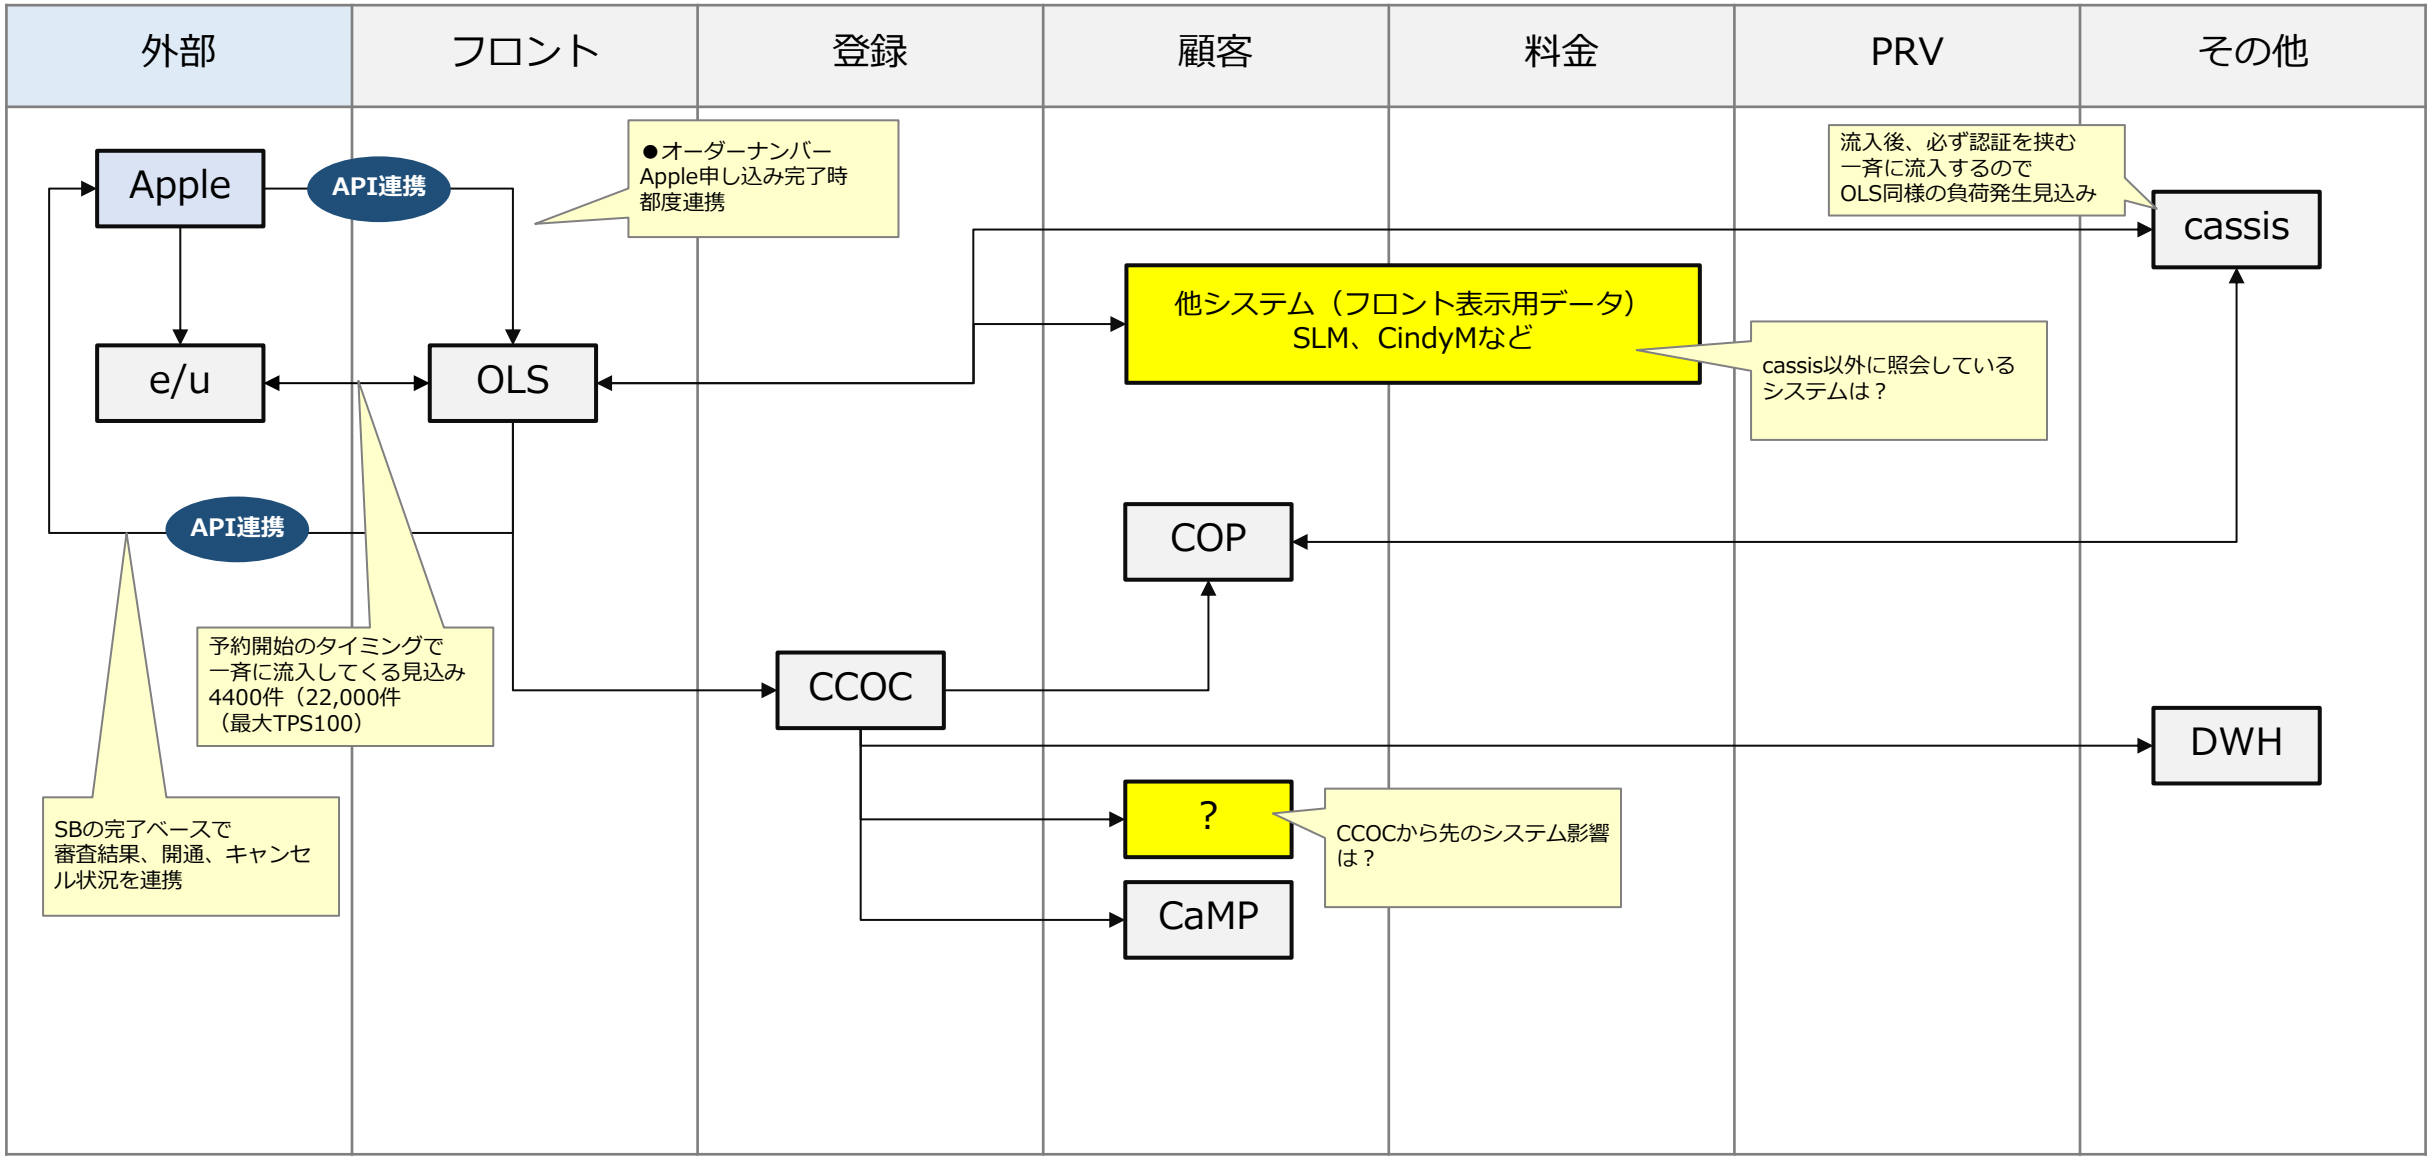

IT部門へのご依頼事項

#	依頼事項	内容	希望期日	補足
①	影響システムの確認	Appleの要求数を耐えるにあたり影響があるシステムの確認をお願いします。 ＜システム要求数＞ 22,000件/1h　TPS100（数秒）	4月	OLS、cassisに影響があるのは、事前にOLSのIT部門より伺っている。OLSのキャパについては確認していただいている状況。
②	現状のキャパシティの確認	SBの現状のキャパシティおよび増設可能な件数の確認をお願いしいます。	4月	4月末にApple側へいったん現状のSBの上限について共有をおこなう。先方要求を完全にかなえることができないため現状を共有し、合意点について先方と協議するため。
③	増強可否確認	Appleの要求数を目標値として、2024年9月をターゲットとして場合、どこまで増設できるのかご確認をお願いたします。 増やす余地があるのか？ 余地がないなら代替案を検討する必要があるので、先方への回答が必要。	4月	満額回答ができればよいが、できない可能性が非常に高いのでどこまでできるか、そもそもできないから代替案の検討が必要なのか判断するため増強可否の確認が必要。

Apple システム要求数

Appleは見込みに対して、5倍のシステム設計をおこなう、SB側にも同等の体制を要望。

		Apple	
Date	Time	Volume Forecast	System Load Testing Quantity
16-Sep	21:00	4,398	21,992
16-Sep	22:00	735	3,674
16-Sep	23:00	322	1,608
17-Sep	0:00	192	959
17-Sep	1:00	108	539
17-Sep	2:00	72	361
17-Sep	3:00	55	277
17-Sep	4:00	45	223
17-Sep	5:00	46	230
17-Sep	6:00	60	302
17-Sep	7:00	75	374
17-Sep	8:00	97	485
17-Sep	9:00	102	511
17-Sep	10:00	103	513
17-Sep	11:00	98	489
17-Sep	12:00	98	489
17-Sep	13:00	96	481
17-Sep	14:00	88	439
17-Sep	15:00	92	460
17-Sep	16:00	86	431
17-Sep	17:00	84	418
17-Sep	18:00	80	401
17-Sep	19:00	74	368
17-Sep	20:00	80	400

FY23 SB実績＋Apple要求数 ※Apple要求数はシステム設計要求数

SBのFY23実績と合算して検討した場合、初動1時間に80,000件の流入見込み。

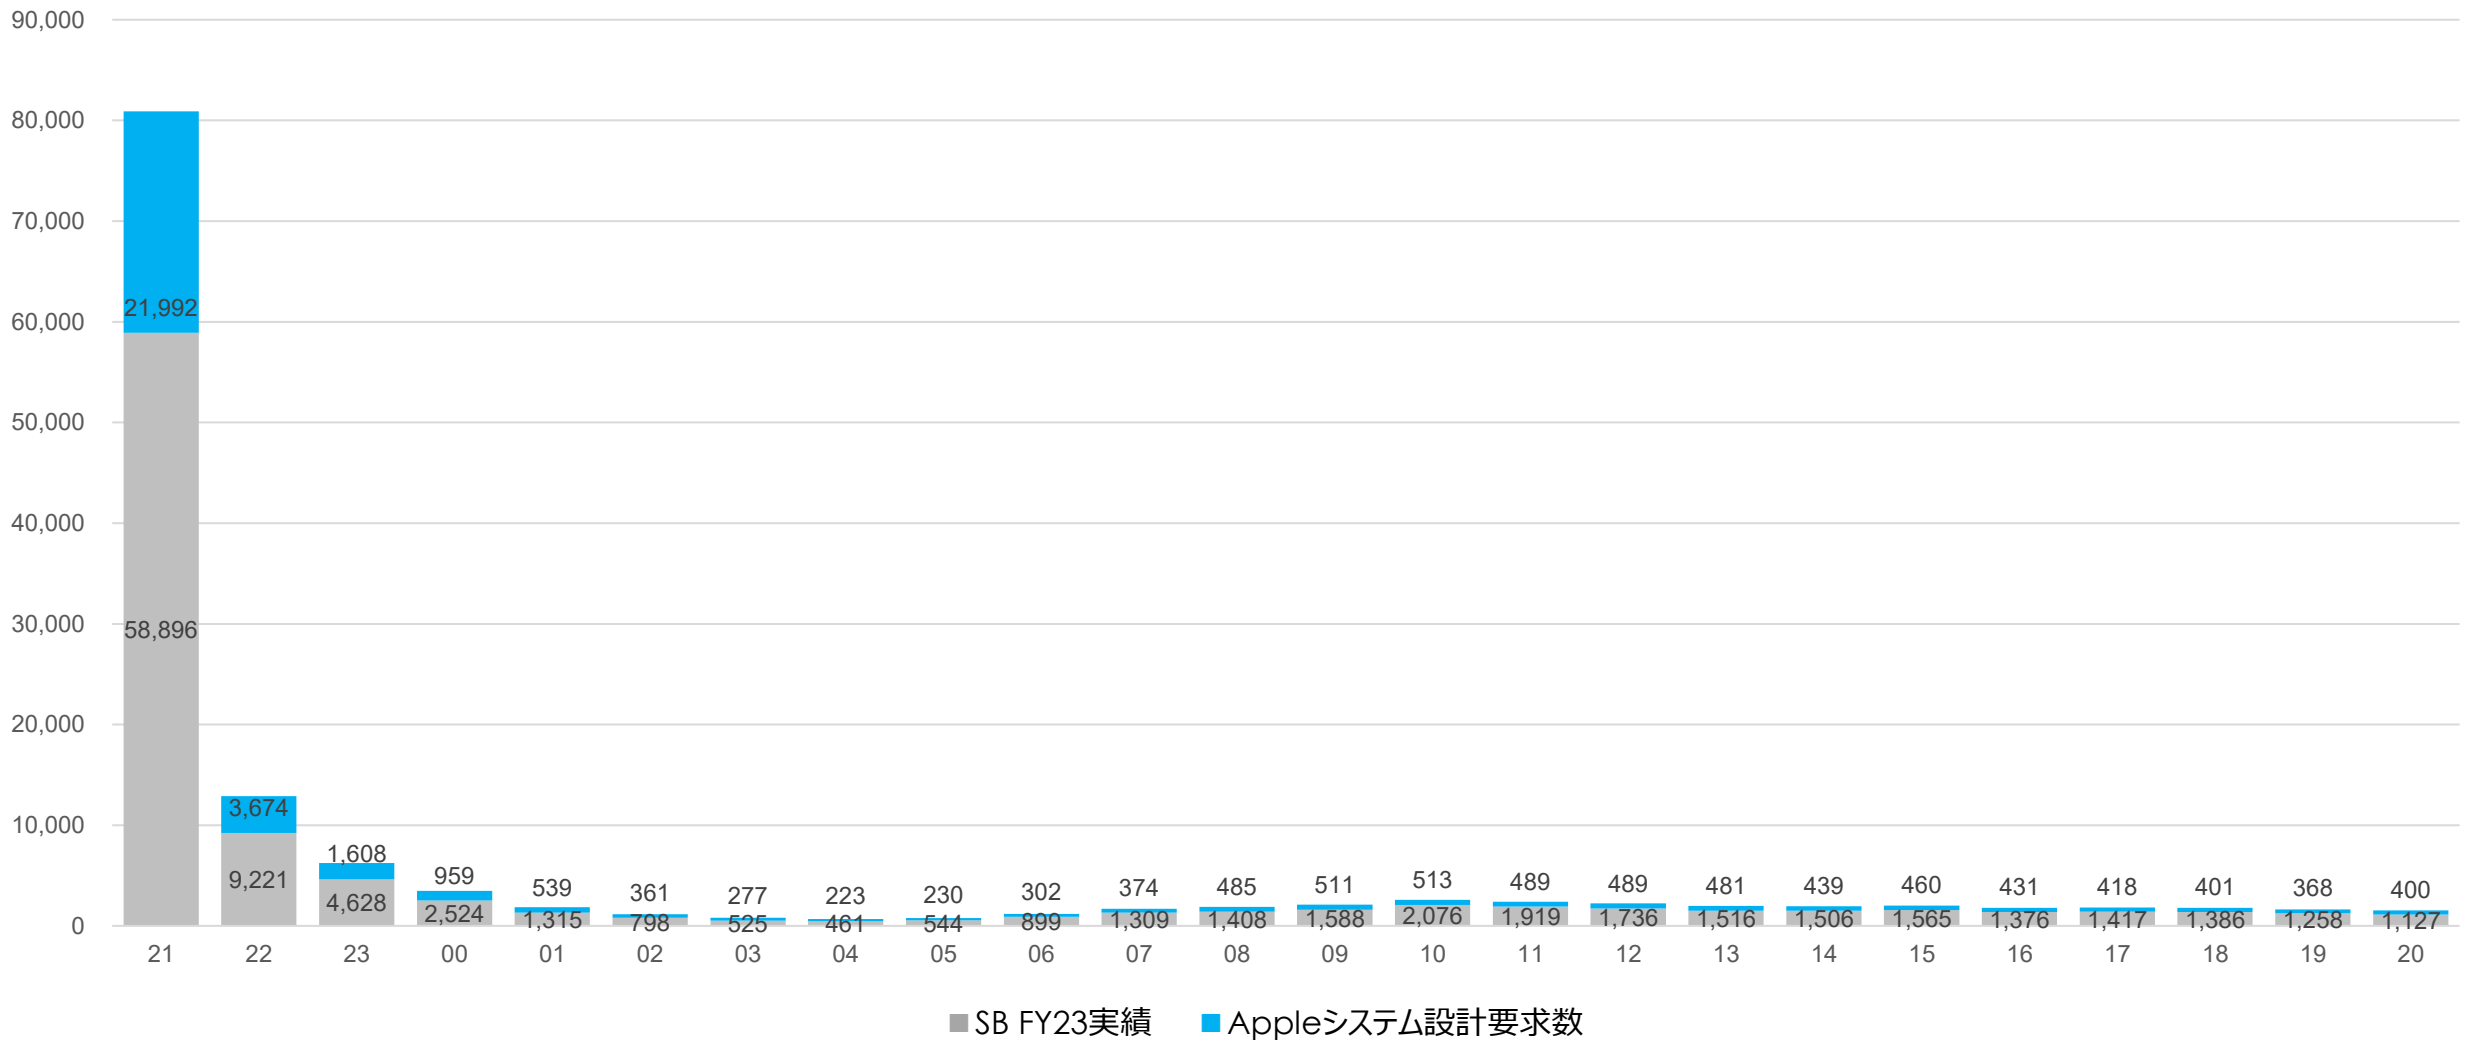

FY23 SB実績＋Apple要求数　※初動1時間詳細

Apple要求数はシステム設計要求数

SBと合算すると1分間で最大12,000件の流入が予測される。

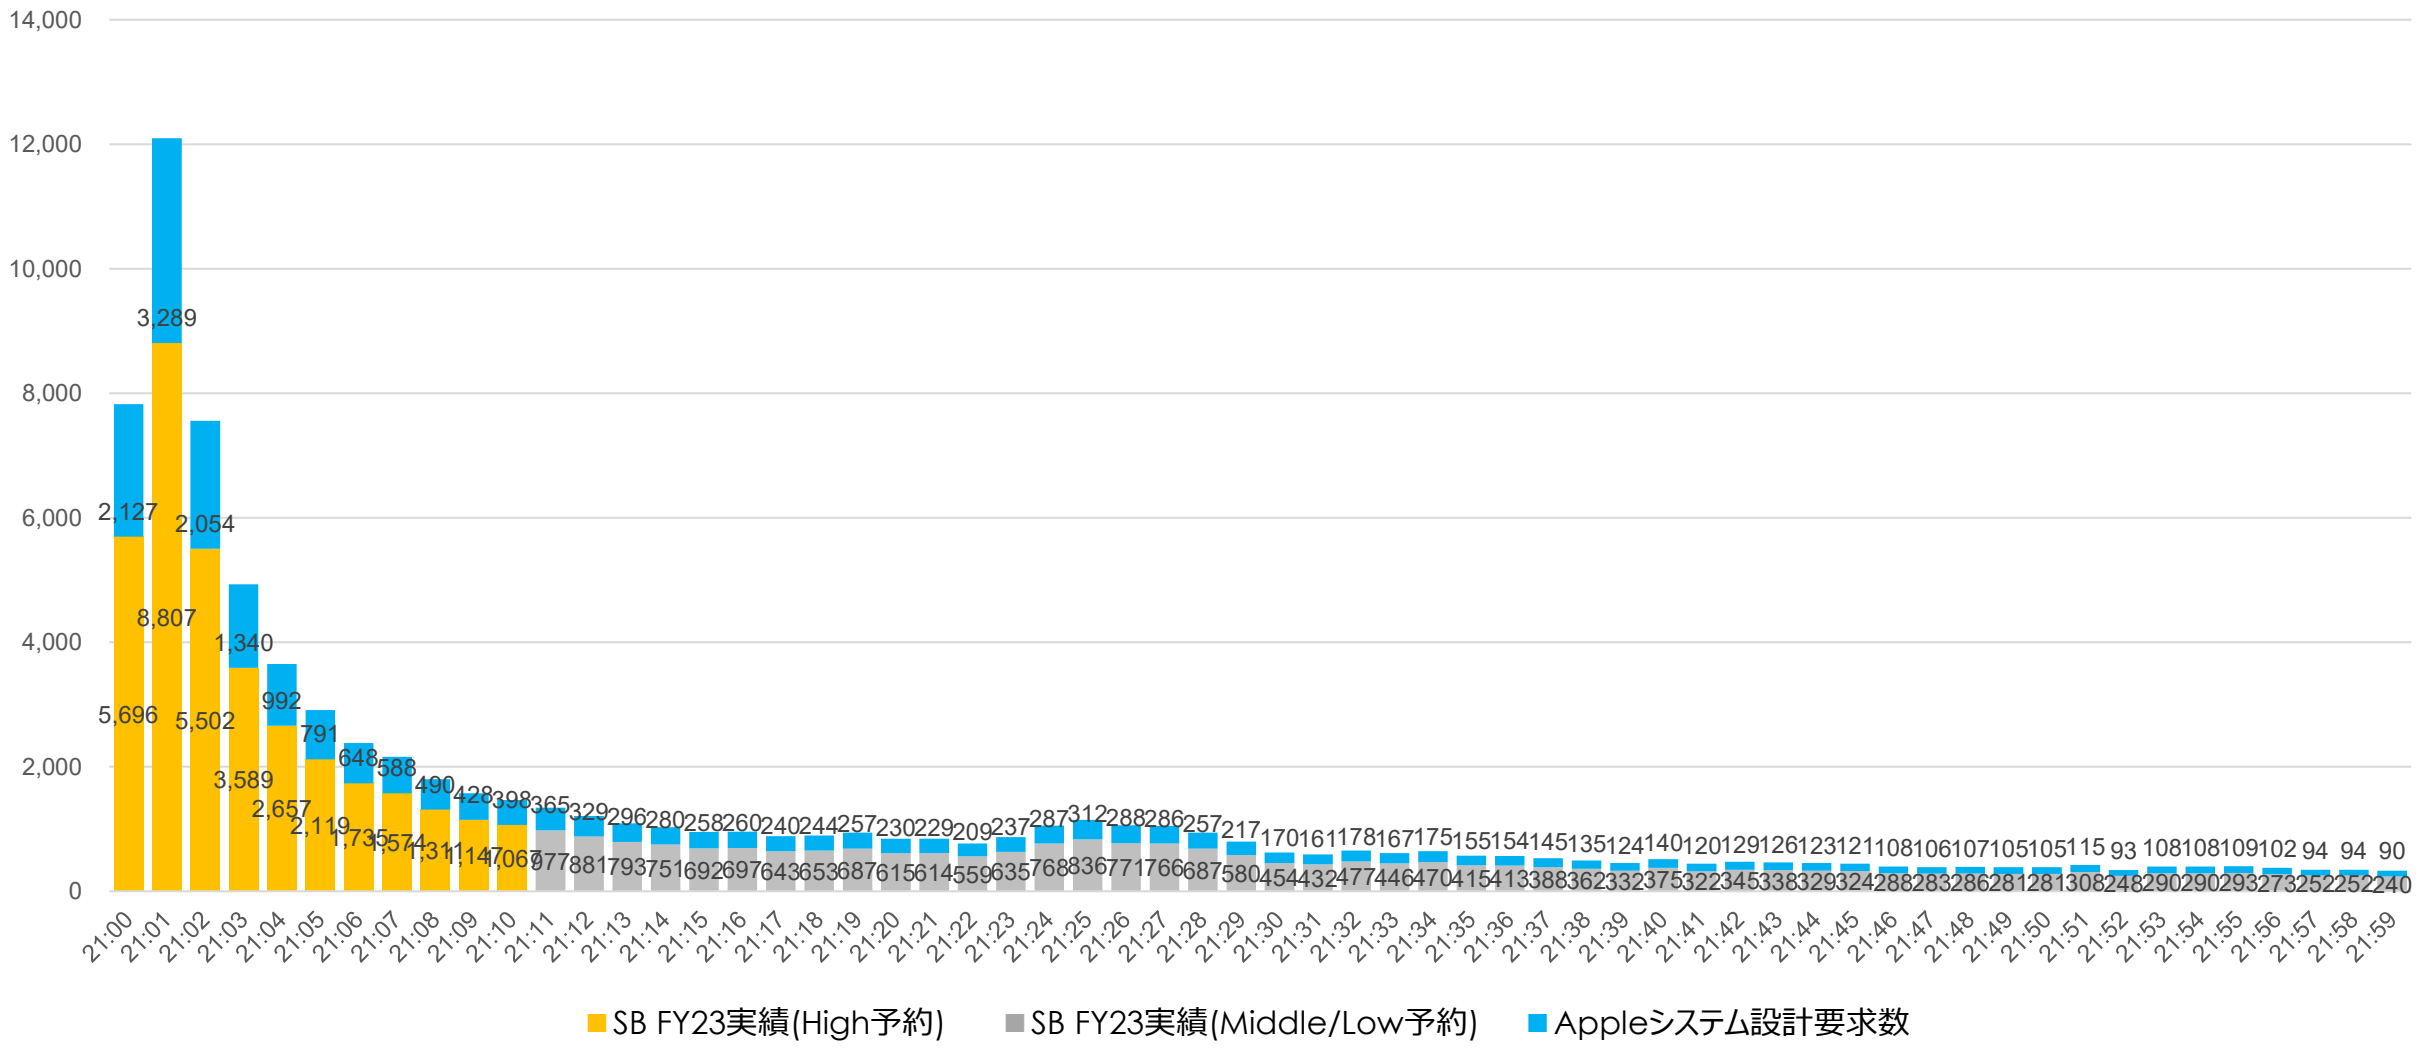

スケジュール

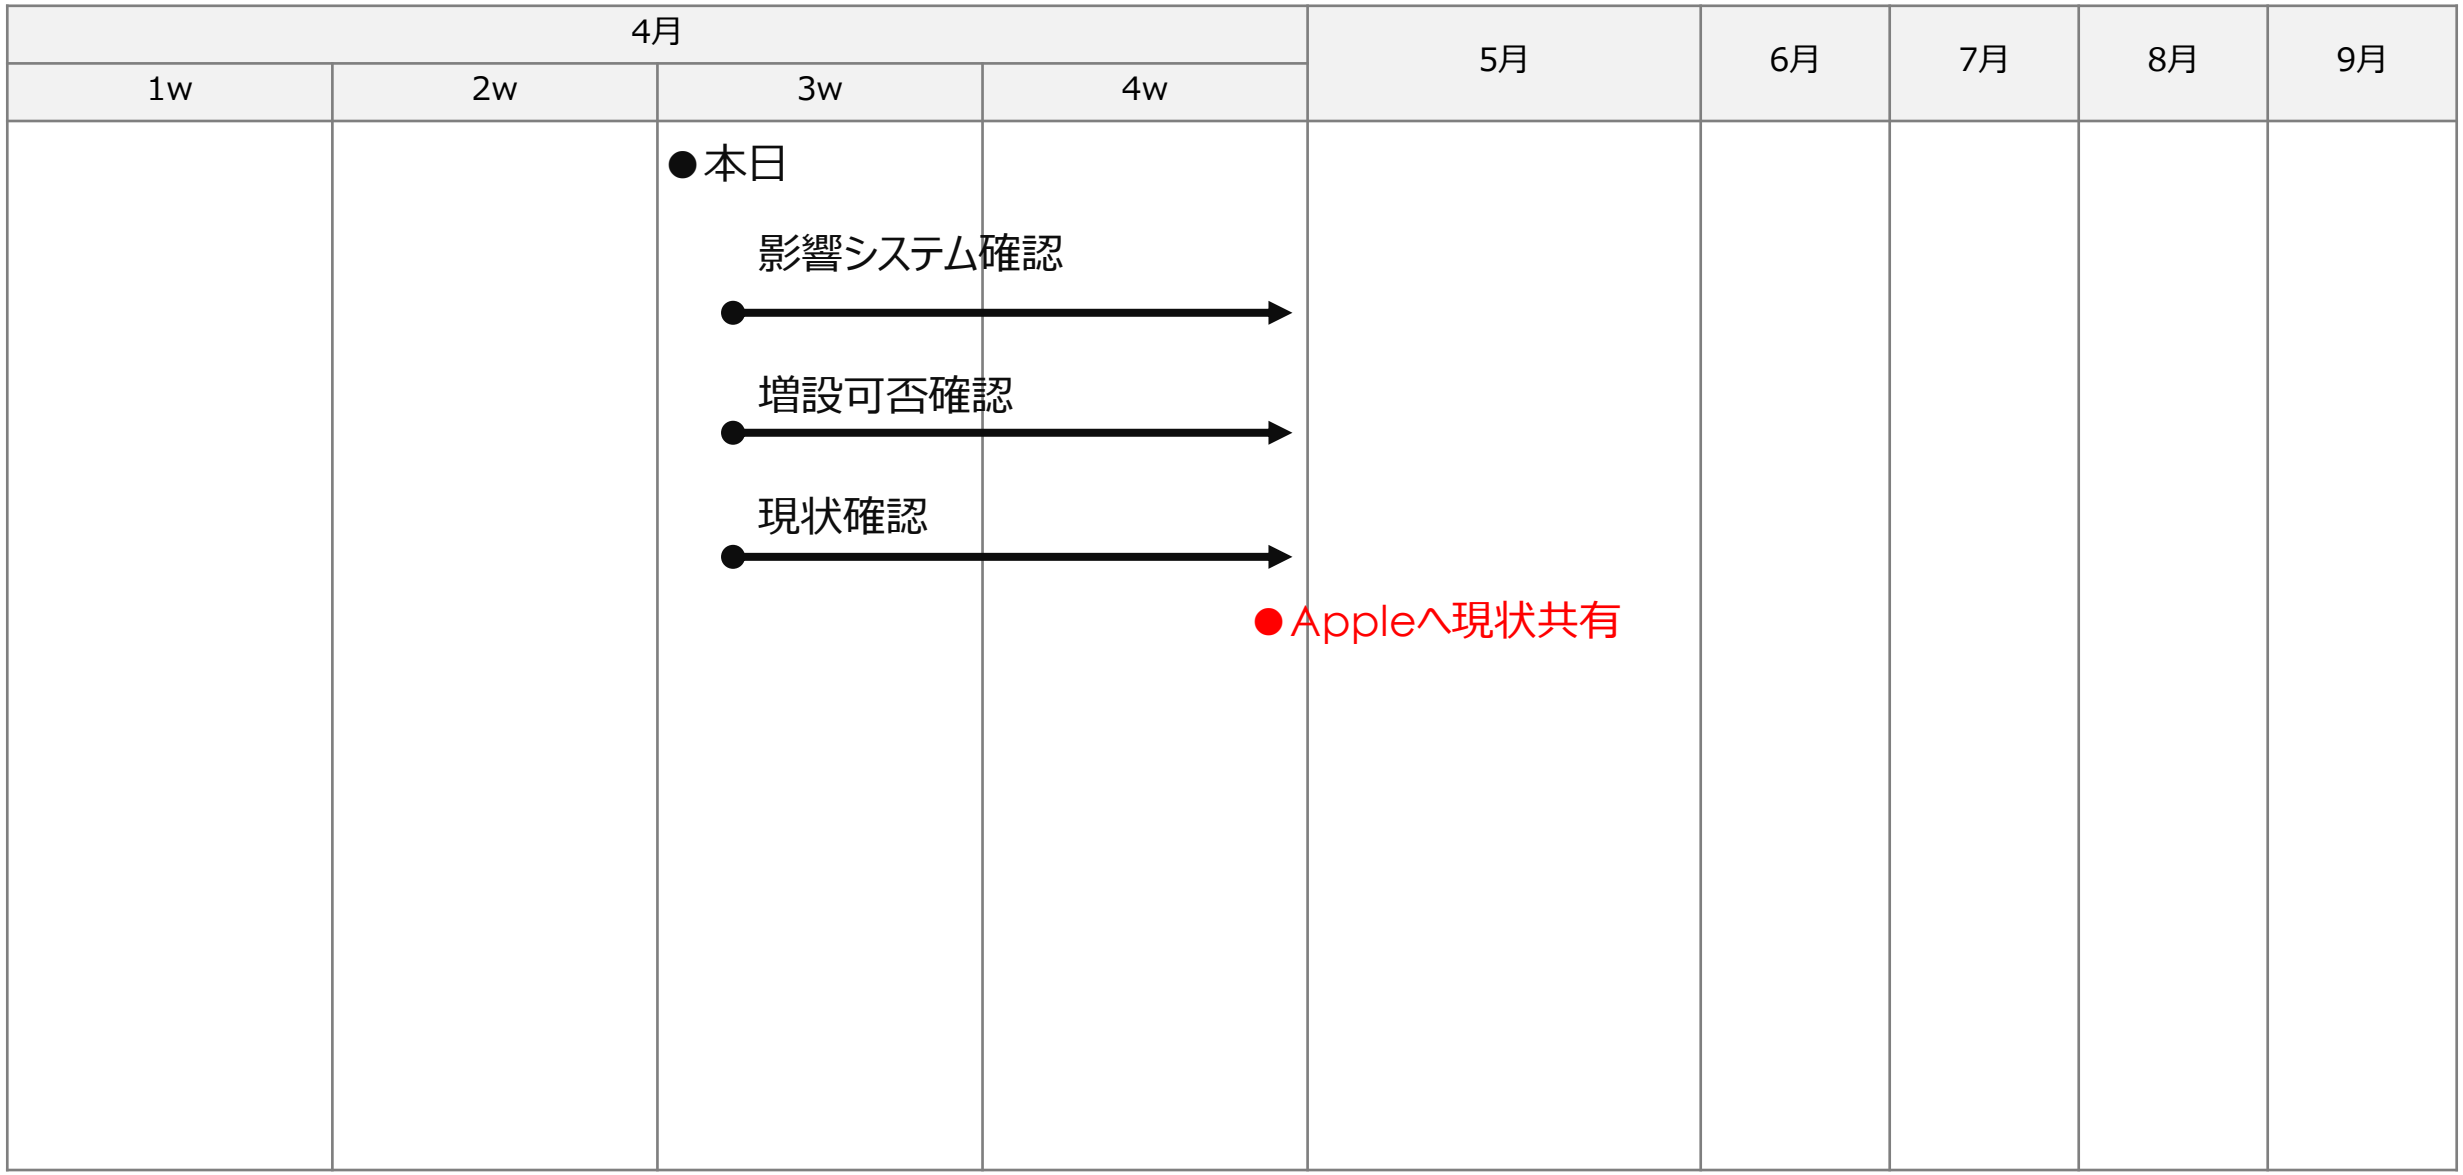
4月
5月
6月
7月
8月
9月
1w
2w
3w
4w
●本日
影響システム確認
増設可否確認
現状確認
●Appleへ現状共有

memo

Appleの件数＞申込数

EOF
