【案件キック】
OLS下期業務改善施策
SIMセット出荷仕様改善について

顧客基盤推進本部 オウンドメディア推進統括部
オンラインショップ企画部 オンラインショップ推進課

2024/10/22

Confidential / © SoftBank Corp.

アジェンダ

1 ｜ 概要
2 ｜ 効果
3 ｜ システム間連携、開発影響範囲の確認
4 ｜ 影響する関係部門
5 ｜ スケジュール案
6 ｜ 予算

Confidential / © SoftBank Corp.

1 ｜　概要

Y!モバ同様に2明細で出荷指示を出すことにより
出荷システムでの自動梱包・出荷オペレーションを可能にする

AsIs

No	商品名	数量	納入予定日	USIMタイプ	IMSIタイプ	原価カテ
1	APWNK9/iPhone 15 Pro Max 1TB + USIM(Black Titanium)	1	2023/12/16	電番なし		SB商

移動機＋SIMセットが1明細となって出荷指示。倉庫にて移動機・SIMのセット組み手作業が発生

ToBe

No	商品名	数量	納入予定日	USIMタイプ	IMSIタイプ
1	APSNK9 iPhone 15 Pro Max 1TB(Black Titanium)	1	2023/12/16		
2	ZTWHR1 nanoUSIM A(S)	1	2023/12/16		

2明細（移動機・SIM）で出荷指示することで、出荷システムで自動梱包が可能に。（YM同様の仕様）

Confidential / © SoftBank Corp.

2｜　効果

※削減工数からピースレート社との契約変更実施することで

950万円／年のコスト削減が実現

AsIs
手作業で対応

受注データを確認

移動機とSIMをセット組み

ToBe
オートメーション

Y!モバ同様、2明細でデータ連携

商品名	数量
APWNF7 iPhone 15 Pro 256GB	1
ZTWHR1 nanoUSIM A(S)	1

出荷システムで自動梱包



Confidential / © SoftBank Corp.

3｜　システム間連携、開発影響範囲

契約種別やSIM同梱有無によって、OLS内で出荷情報として変換し、SCMOneへ情報連携。開発範囲としてはOLSのみで完結想定（但し、試験はSCMOne側でも実施予定）

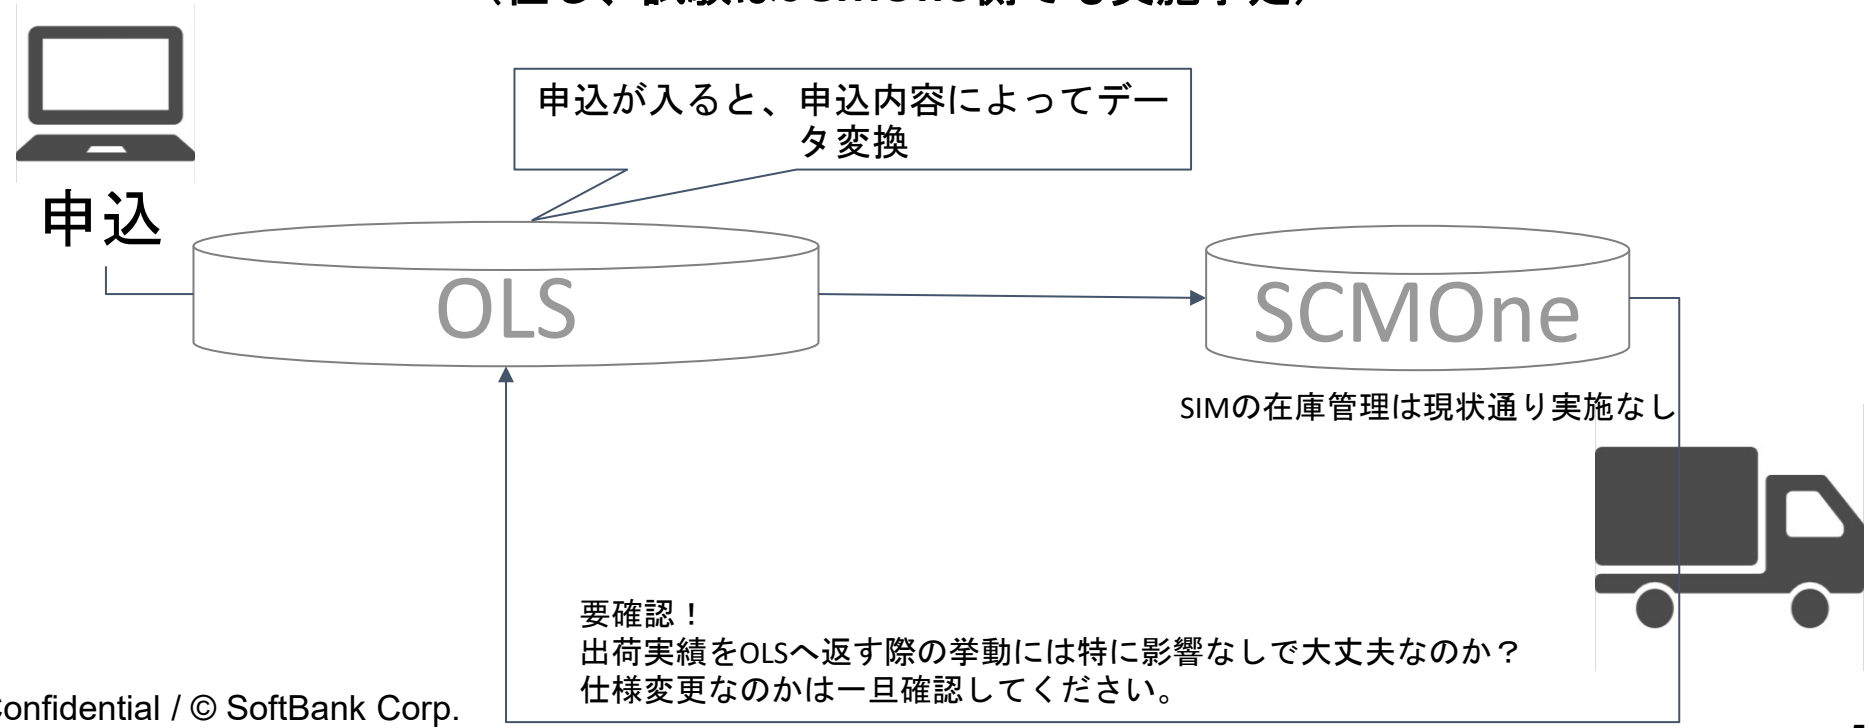

Confidential / © SoftBank Corp.

4｜　影響する関係部門

出荷仕様を変更することによる影響部門の特定が必要
ロジ・顧客基盤・CS以外に影響する部門の確認が必要

モバ推	顧客基盤	ロジ	ＣＳ
商品構成表作成 → Mars登録	OLS連携	SCMOne連携	CS対応

	APSNFE	iPhone 15 Pro 1T	標準セット
	APSNFF	iPhone 15 Pro 1T	標準セット
	APSNFG	iPhone 15 Pro 1T	標準セット
	APWNF1	iPhone 15 Pro 128G＋SIM	USIM付標準セット
	APWNF2	iPhone 15 Pro 128G＋SIM	USIM付標準セット

標準セットとして登録
例）APSNK9

ＳＩＭセットの場合
例）APWNK9

移動機単体の場合
例）APSNK9

GINIE連携

◆ＳＩＭセット商品の返品処理
（受取後の返品）

◆持ち戻り→在庫繰り戻し
現物を良品化する時のバラす作業
がなくなる

標準セットとＳＩＭにばらす
APWNK9 → APSNK9

Confidential / © SoftBank Corp.

5｜　スケジュール（仮）

2025年1月開発着手
3月リリース目標　※FY24内でCAPEX予算消化希望

※3、4月リリースはロジ繁忙期のため蓋閉じ対応の上で5月リリース希望

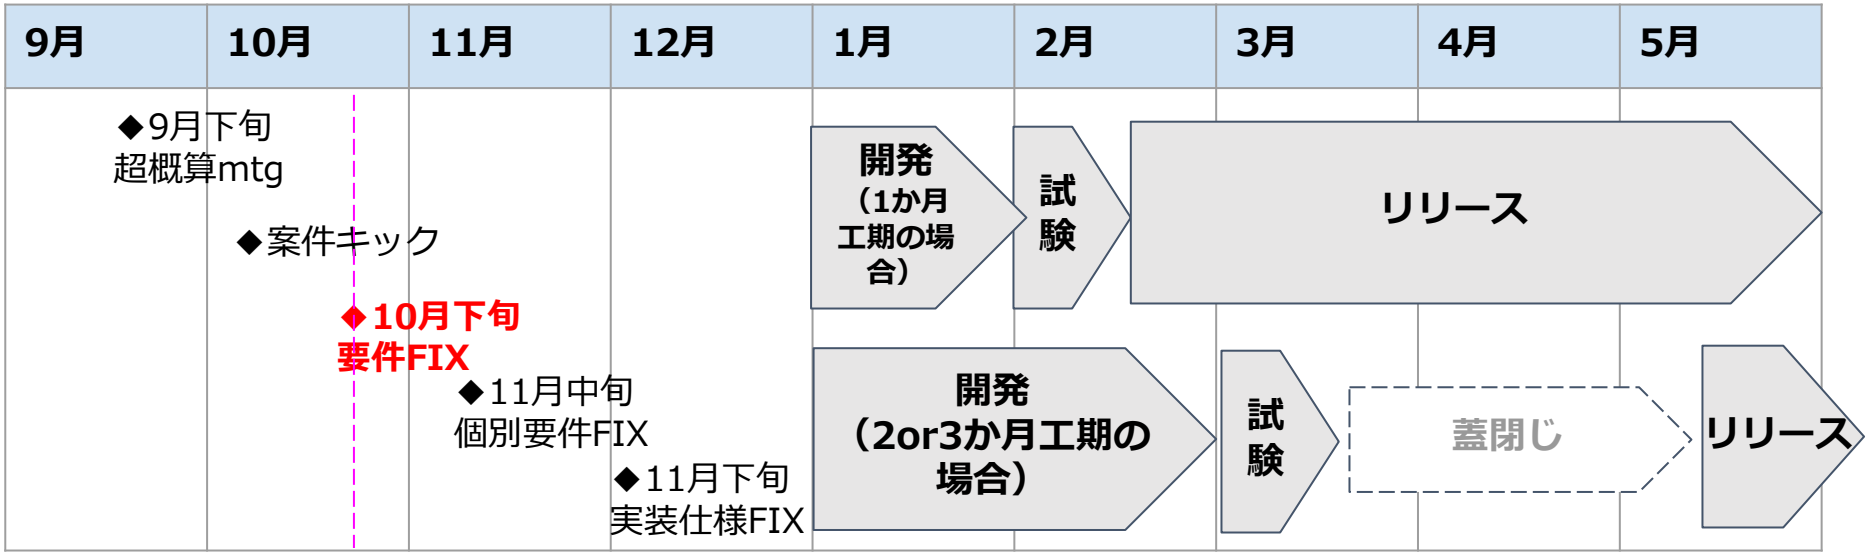

Confidential / © SoftBank Corp.

6｜　予算

計画中案件「#23業務効率化　26,875千円」の内数で実施

No	案件名	OLS超概算費用 （概算工数）	効果見込み	他影響システム
1	依頼受付フォームからのシステム登録機能実装	1,000万円（10人月）	336万円／年	CINDY
2	SIMセットの出荷仕様改善	500万円（5人月）	950万円／年	SCMOne SLIMS（デマコン対象外）
3	管理画面機能改善	1,100万円（11人月）	1,200万円／年	
	合計	2,600万円	2,486万円／年	

Confidential / © SoftBank Corp.

7｜　試験内容（SLIMS）

No	項目	詳細	備考
1			
2			
3			

Confidential / © SoftBank Corp.

参考｜　システム間連携

契約種別やSIM同梱有無によって、OLS内で出荷情報として変換し、SCMOneへ連携。
開発範囲としてはOLSのみで、試験はSCMOne（SLIMS含む）でも実施

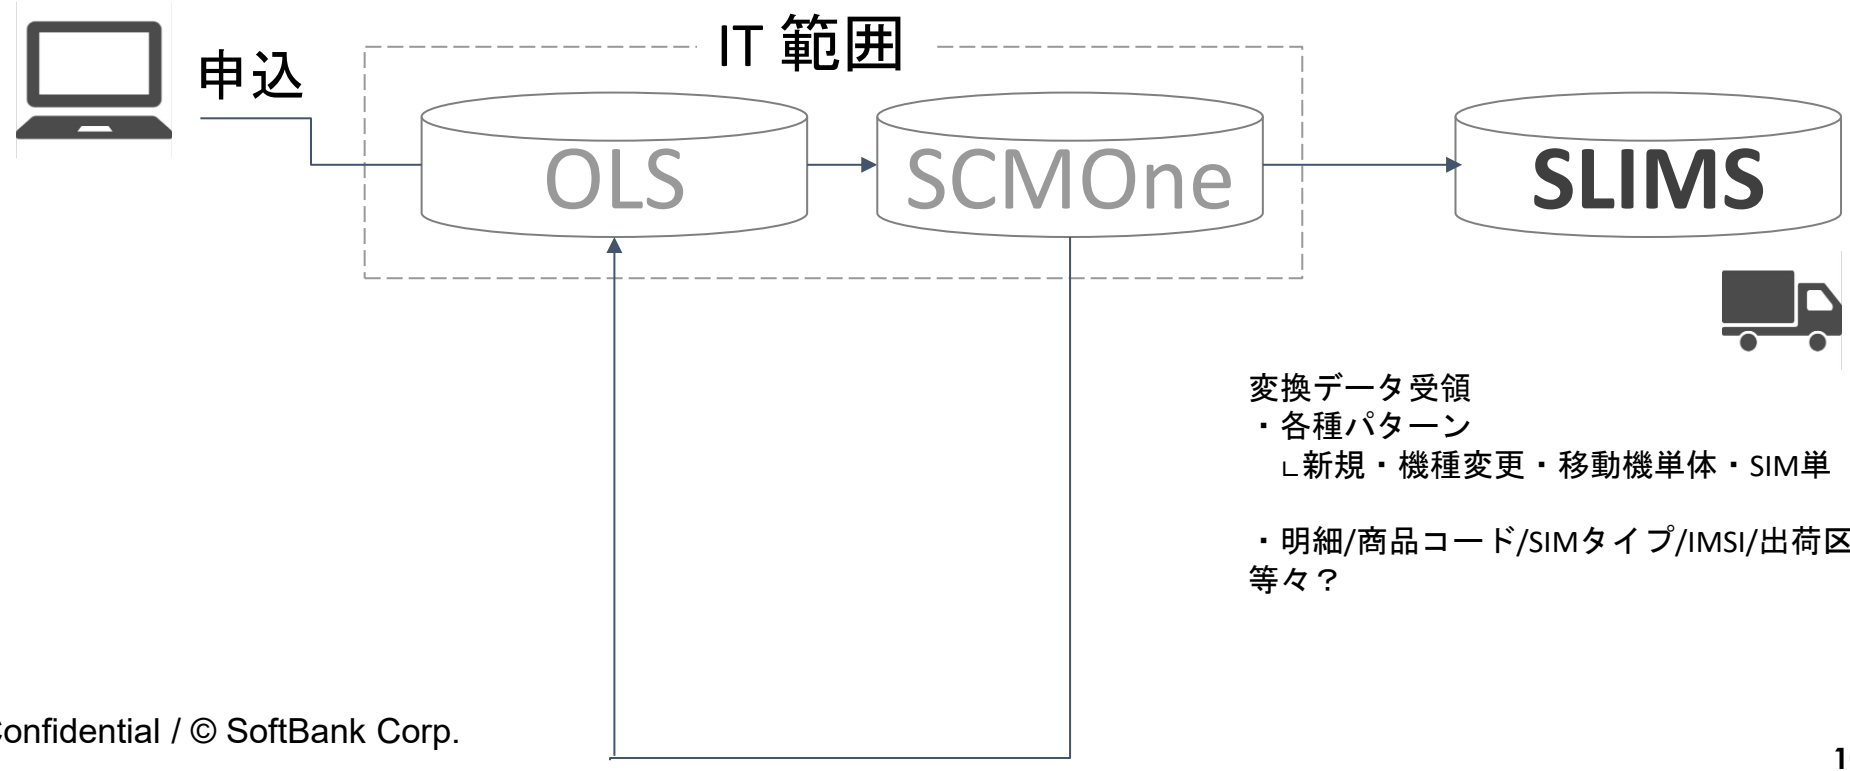

変換データ受領
・各種パターン
　└新規・機種変更・移動機単体・SIM単

・明細/商品コード/SIMタイプ/IMSI/出荷区分
等々？

Confidential / © SoftBank Corp.

更新履歴

No.	更新日	更新ページ	更新箇所
1	2024/10/22	p.7	スケジュール（3, ４月リリースの場合は蓋閉じにて5月リリースとする）※予算消化は変わらずFY24内希望
2			
3			
4			

Confidential / © SoftBank Corp.

APPENDIX

Confidential / © SoftBank Corp.

参考：定量的効果　算出ロジック

■USIM	セット数量												
LC	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2401	2402	2403	総計
LCI	16,311	13,905	12,345	18,212	16,237	46,155	39,828	22,078	22,708	21,393	15,985	21,604	266,761
LCO	9,229	8,289	7,697	12,894	9,764	24,663	25,532	14,643	14,821	11,447	8,525	11,802	159,306
LCF	1,377	1,097	996	2,589	1,219	1,918	2,203	1,258	2,506	1,856	524	1,552	19,095
総計	**26,917**	**23,291**	**21,038**	**33,695**	**27,220**	**72,736**	**67,563**	**37,979**	**40,035**	**34,696**	**25,034**	**34,958**	**445,162**
作業時間/	**セット**	生産性	80台/人時										
	時給	LCI	@1,720円		LCO	@1,700円		LCF	@1,520円				
区分	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2401	2402	2403	総計
作業時間	204	174	154	228	203	577	498	276	284	267	200	270	3,335
作業費用	350,687	298,958	265,418	391,558	349,096	992,333	856,302	474,677	488,222	459,950	343,678	464,486	5,735,362
作業時間	115	104	96	161	122	308	319	183	185	143	107	148	1,991
作業費用	196,116	176,141	163,561	273,998	207,485	524,089	542,555	311,164	314,946	243,249	181,156	250,793	3,385,253
作業時間	17	14	12	32	15	24	28	16	31	23	7	19	239
作業費用	26,163	20,843	18,924	49,191	23,161	36,442	41,857	23,902	47,614	35,264	9,956	29,488	362,805
作業時間	336	291	263	421	340	909	845	475	500	434	313	437	5,565
作業費用	572,966	495,942	447,903	714,747	579,742	1,552,863	1,440,714	809,743	850,782	738,462	534,790	744,767	9,483,419

Confidential / © SoftBank Corp.
