iOS18.2検証対応状況について

（本編 17ページ）

GINIE推進部　GINIE推進4課

2025/6/26

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

サマリ

いままで	・業務担当、直営店、代理店で検証 ・検証の結果『影響大』の事案によりリリース判定：延期
現在状況	・影響システムの洗い出し └クルトレ、接客ナビ、デジタルカタログ(SB/YM)計4つ ・各システムでの改修検討 ・OneGINEアプリでのシステム制御検討
今後	・iOS18.2のリリースについて対応方針判断必要

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

サマリ

いままで	・業務担当、直営店、代理店で検証 ・検証の結果『影響大』の事案によりリリース判定：延期
現在状況	・影響システムの洗い出し ・各システムでの改修検討 ・OneGINEアプリでのシステム制御検討
今後	・iOS18.2のリリースについて判断必要

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

OS検証の必要性について

iPadを新規購入した際に、その時のOSで正常動作するか確認

老朽化

・電池容量低下
・セキュリティ懸念

新品へ
リプレイス

・電池容量がアップ
・性能向上

OS検証

・アプリの動作テスト
・GINIE等システムテスト

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

案件のプロセスについて

アプリリリースまで約8ヶ月間(店頭配布開始)

STEP1

案件KICK

└タスク整理
└検証端末手配
└検証依頼

STEP2

検証・開発

└新iOS検証
└改修/開発
└実店舗検証

STEP3

リリース

└リリース判定
└動作確認
└端末配備

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

社内検証結果

3件の事象を検知

	検知	改修予定	改修済み
致命的な事象	1件	1件	-
軽微な事象	2件	2件	1件

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

社内検証結果内訳

対象システム	不具合の概要	期待値	改修時期	判定
来店誘導コール	表示不良 操作アイコン非表示	操作アイコンの正常表示	5/21	可
SMART	文字表示不良 └顧客名の表示間隔	顧客名の文字間隔の修正	未定	可
クルトレ その他複数個所	一部画面表示の不具合 └表示領域不良 └正常表示不可	正しく表示され、機能を正常に使用できること	未定	不可

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

致命的な事象

■原因

└iOS18固有のバグ　※17.1.1以前のOSでは再現なし

動画を全画面にすると、OneGINEで制御している、画面サイズ制御が解除

■対策について

└OneGINEでの制御orコンテンツ側での全画面制御が可能か検討中

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

7

iPadOS18.2リリースについて

判定：リリース不可 延期

（再開日未定）

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

サマリ

いままで	・業務担当、直営店、代理店で検証 ・検証の結果『影響大』の事案によりリリース判定：延期
現在状況	・影響システムの洗い出し ・各システムでの改修検討 ・OneGINEアプリでのシステム制御検討
今後	・iOS18.2のリリースについて判断必要

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

【事象内容】iOS18.2検証対応におけるバグについて

正常動作
※iOS17.1.1までのiPad※

クルトレ動画再生

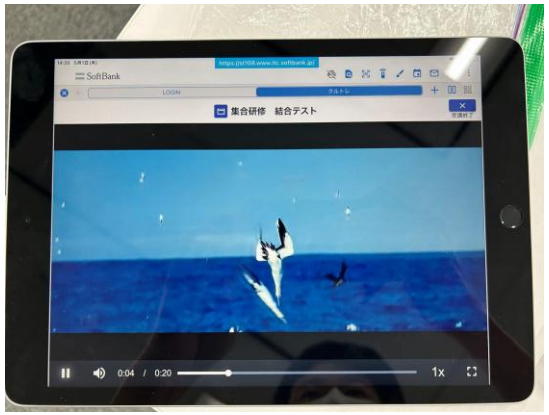

動画再生画面を最大化

最大化を戻す

操作パネルが
正常表示

異常動作
（表示領域不良）

クルトレ動画再生

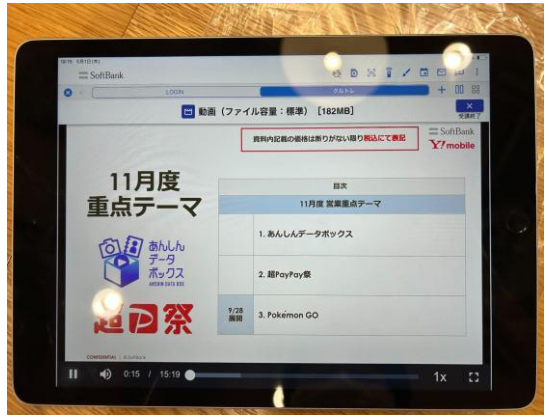

動画の画面再生最大化

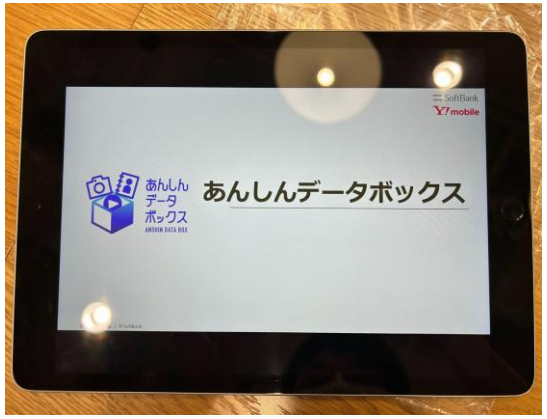

最大化を戻す

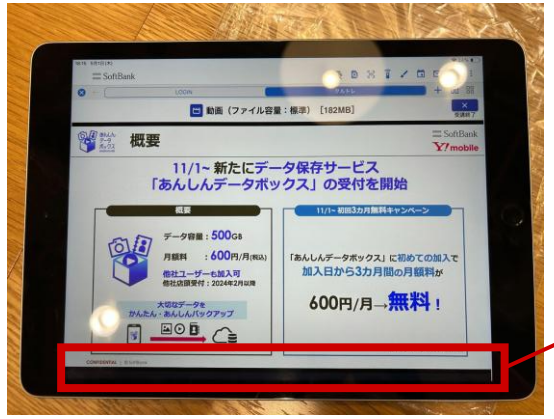

操作パネルが
見切れる

【対策案】iOS18.2検証対応におけるバグについて

当初は・・・関係者会話し②で対応検討

項目/対応案	① 対策せず	② 対象システムにて対応	③ 次期OSに賭ける	④ リリース延期・判断保留（追加案）	⑤OneGINIE改修
実施要項	・改修せず現行のままリリース 発生時はリセット運用	・全画面不可制御 └クルトレ └接客ナビ └デジカタ	・修正VerのOSを待つ	・対策を考える時間を延長	・OneGINIE動画再生方法変更
リリースまでの期間	・最短	・３システムリリース １ヶ月延期想定	・不明	・不明	・不明
メリット	・最短対応	・18.2のリリースは可能	・本事象の解消の担保 （可能性ありの程度）	・？未知数 相談内容次第	・？未知数 解決するか確証無し
デメリット／リスク	・操作リスク高 ・現場 負荷大	・セキュリティリスク └顧客の他タブ操作 ・利便性低下 └顧客の視覚低下 ・各ステム要開発 ・費用再取得	・再OS固定、再検証 ・時期未定 ・再スケジュール調整 ・費用再取得 ・他事象の発生	・確証無しの期間延長	・時間とお金かけて 未解決の可能性あり ・費用再取得
条件・備考	・店頭・関係者の事前理解 ※営業戦略、各システム	工期：2～3週間／影響残る ・店頭、関係者の事前理解 ※営業戦略、各システム タブロックボタンを設ける	・Appleへの問い合わせ継続	・期限付で他案候補を据える	OneGINE上で動作する 全システムの動作確認必要

【現場確認】iOS18.2検証対応におけるバグについて

クルーへヒアリング実施：ほぼのクルーが最大化を利用

全画面ボタンの削除

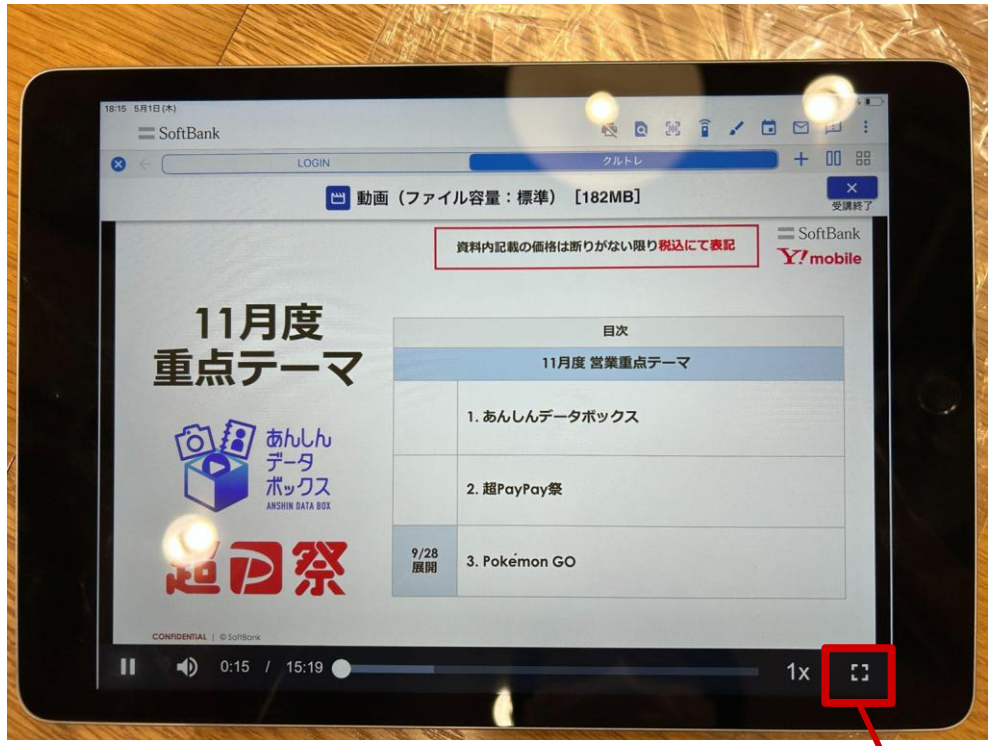

削除

課題

- 動画以外の情報がある事による
  視認性の低下
- お客様が動画視聴する際の
  セキュリティリスク

※勝手にタブを開き、余計な情報を見られる

【対策案】iOS18.2検証対応におけるバグについて

関係者会話し②＋⑤で対応で進める

項目/対応案	① 対策せず	② 対象システムにて対応	③ 次期OSに賭ける	④ リリース延期・判断保留 （追加案）	⑤OneGINIE改修 （6/24改案）
実施要項	・改修せず現行のままリリース 発生時はリセット運用	・全画面不可制御 └クルトレ └接客ナビ └デジカタ	・修正VerのOSを待つ	・対策を考える時間を延長	・OneGINIEのツールバー領域を隠す ・戻るときは、クルーしか知りえない操作でしか戻さない
リリースまでの期間	・最短	・３システムリリース １ヶ月延期想定	・不明	・不明	・確認中 （ブラウザ開発）
メリット	・最短対応	・18.2のリリースは可能	・本事象の解消の担保 （可能性ありの程度）	・？未知数 相談内容次第	・ツールバー領域が出ないので、顧客に予定外の操作を出来なく　する ・セキュリティ向上
デメリット／リスク	・操作リスク高 ・現場 負荷大	・セキュリティリスク └顧客の他タブ操作 ・利便性低下 └顧客の視覚低下 ・各ステム要開発 ・費用再取得	・再OS固定、再検証 ・時期未定 ・再スケジュール調整 ・費用再取得 ・他事象の発生	・確証無しの期間延長	・見栄えの悪さの懸念あり （実装見積次第）
条件・備考	・店頭・関係者の事前理解 ※営業戦略、各システム	工期：2～3週間／影響残る ・店頭、関係者の事前理解 ※営業戦略、各システム	・Appleへの問い合わせ継続	・期限付で他案候補を据える	・本策は暫定として、恒久は別途継続検討

【対策内容】iOS18.2検証対応におけるバグについて

現場からの意見を反映し②＋⑤の対応で検討

全画面ボタンの削除

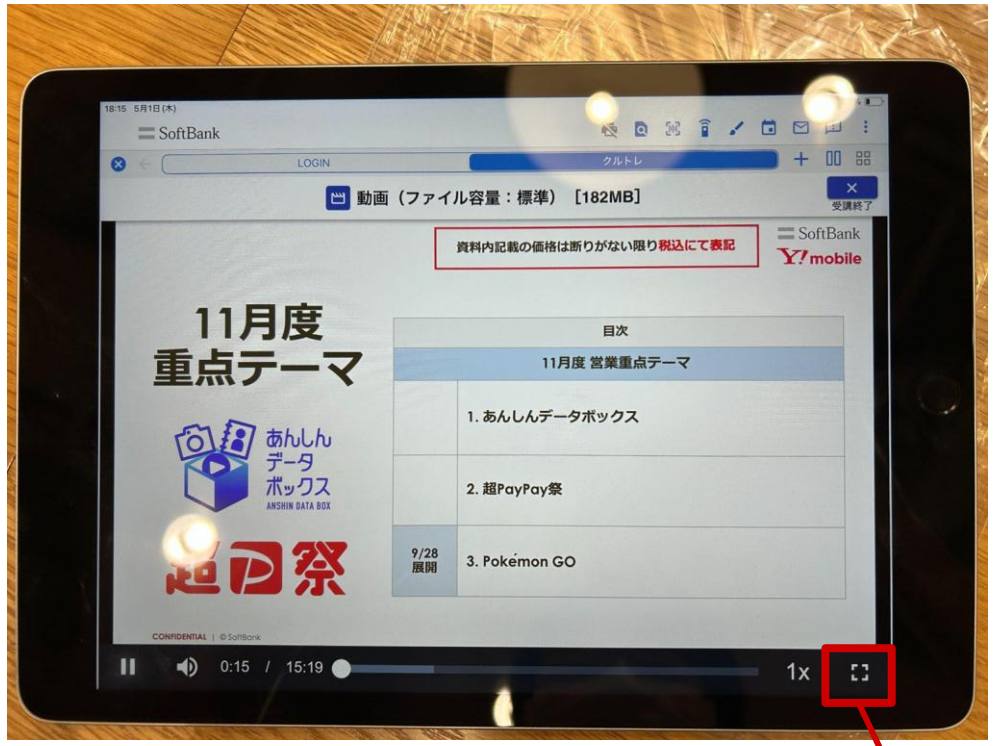

削除

『ツールバー領域』を隠す対応

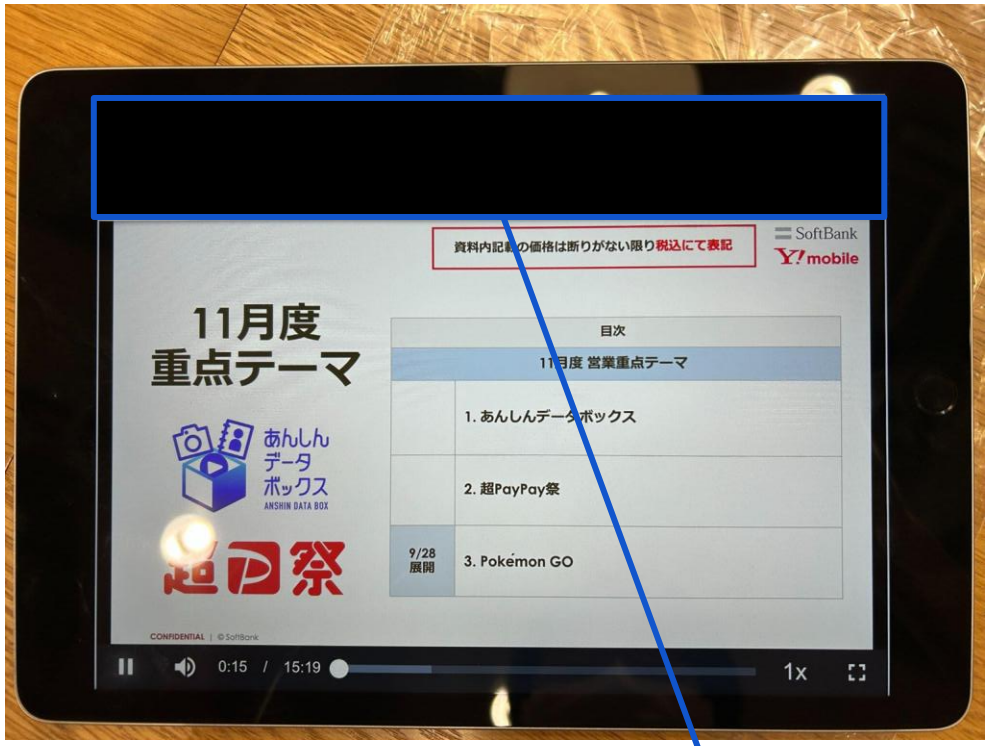

ブラックアウトし隠す

【対策内容】iOS18.2検証対応におけるバグについて

たとえば・・・開始と終了は隠しボタン

『ツールバー領域隠し』開始

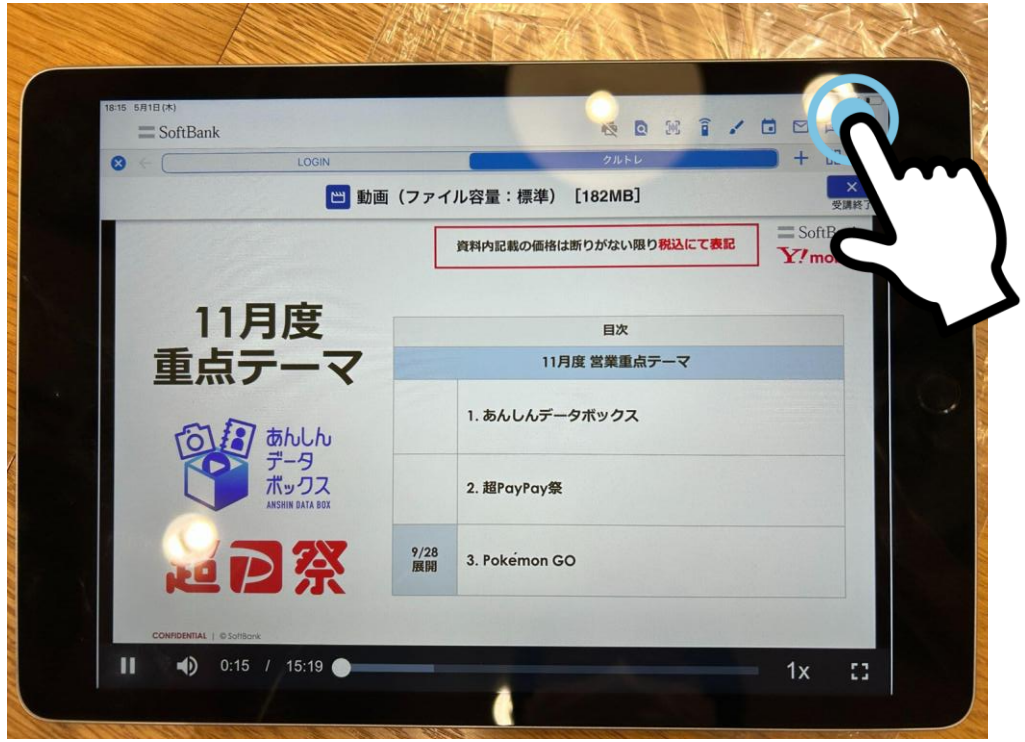

『ツールバー領域隠し』終了

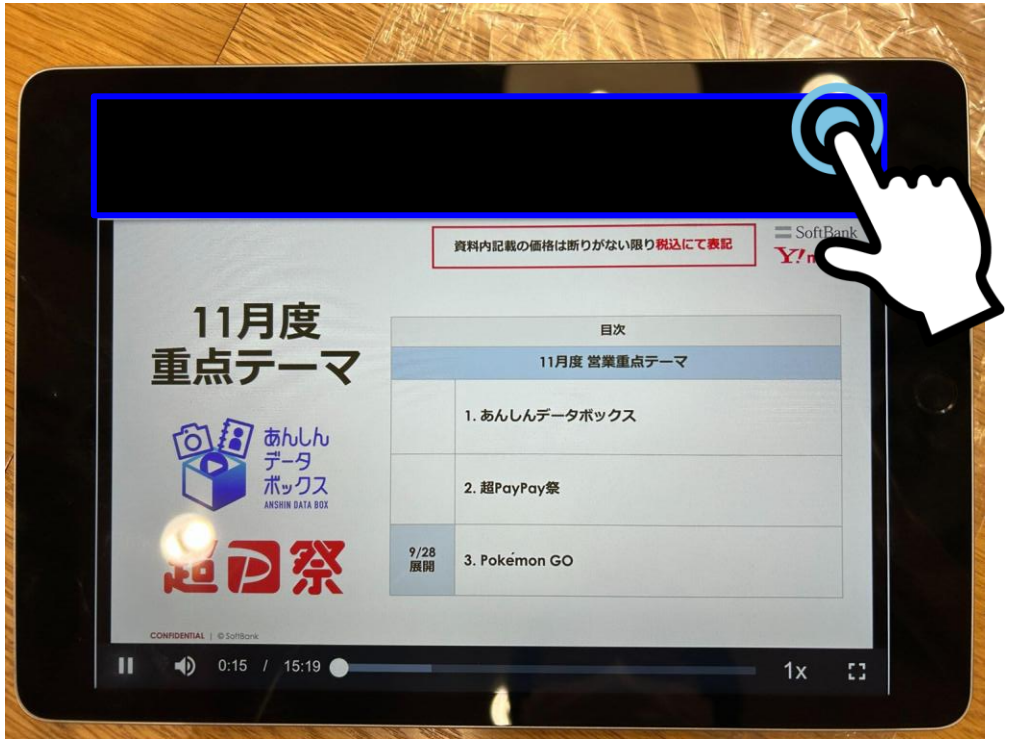

クルーが操作に迷わない操作方法で検討中

【進め方】iOS18.2検証対応におけるバグについて

将来的には、アプリ側での制御で対応検討

暫定対応※各システムでの制御あり

恒久対応※各システムの制御無し

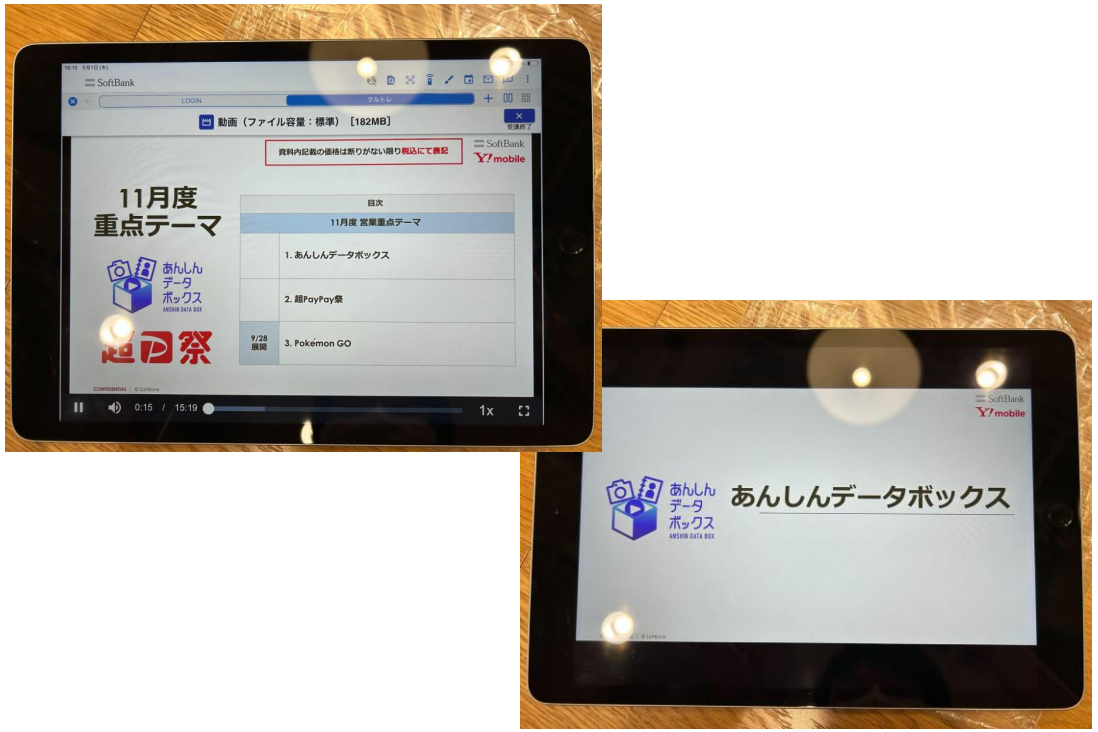

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

16

Appendix

サマリ

いままで	・業務担当、直営店、代理店で検証 ・検証の結果『影響大』の事案によりリリース判定：延期
現在状況	・影響システムの洗い出し ・各システムでの改修検討 ・OneGINEアプリでのシステム制御検討
今後	・iOS18.2のリリースについて判断必要 └各システムで対応方針で進める。 進めるにあたり課題が出た場合は、関係者集め会話

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

2段階対応について

項目/対応案	①暫定	②恒久対応
実施要項	・改修せず現行のままリリース 発生時はリセット運用	・疑似全画面制御 └クルトレ └接客ナビ └デジカタ
リリースまでの期間	・最短	・３システムリリース １ヶ月延期想定
メリット	・最短対応	・18.2のリリースは可能
デメリット／リスク	・操作リスク高 ・現場 負荷大	・セキュリティリスク └顧客の他タブ操作 ・利便性低下 └顧客の視覚低下 ・各ステム要開発 ・費用再取得
条件・備考	・店頭・関係者の事前理解 ※営業戦略、各システム	工期：2～3週間／影響残る ・店頭、関係者の事前理解 ※営業戦略、各システム タブロックボタンを設ける

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.

今後について

iOS18.2のリリース可否について検討必要

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

End of File

CONFIDENTIAL | @ 2025 SoftBank Corp.
